

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | |
|------------|---------------|---|--------|---------------|-------------------------|
| 20/12/2022 | SEGUNDA | X | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | | SÁBADO | Dias Corridos | |


| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | Das 07h às 17.00h | | | | |
| CHUVOSO | X | | | | |

| EQUIPE OBRA | | | EQUIPE PRESENTE | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
|-------------|-------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| NOME | FUNÇÃO | | NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | | |
| EDMILSON | SERVENTE | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: COMEÇOU A RETIRAR OS FORROS DO PLENÁRIO.
 OBS: DEVIDO Á FORTE CHUVA IMPEDINDO DE TRABALHAR NA PARTE EXTERNA, FOI FEITO SERVIÇO SOMENTE NA PARTE INTERNA.

Registro Fotografico:

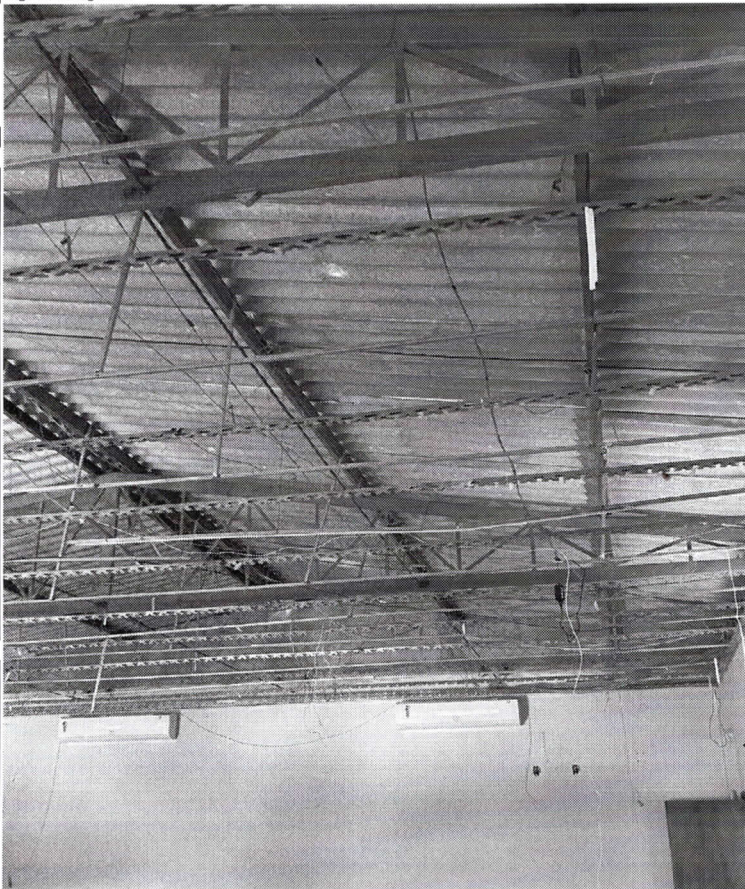

| REGISTRO DE OCORRÊNCIA | | |
|------------------------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

**BRUNO
GONCALVES DE
CASTILHO:0976665
5650**

Assinado de forma digital
por BRUNO GONCALVES DE
CASTILHO:09766655650
Dados: 2023.02.02 11:15:31
-03'00'

Samira Heroldano Pereira
Engenheira Civil
CPE A-RJ 2015125090
Serviço de Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | DADOS DA OBRA | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| 22/12/2022 | SEGUNDA | | QUINTA | X | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | | SEXTA | | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | | SÁBADO | | Dias Corridos | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant | |
| BOM | Das 07h às 17.00h | | | BL EDIFICAÇÕES | | |
| POUCA CHUVA | | | | | | |
| CHUVOSO | | X | | | | |
| EQUIPE PRESENTE | | | | | | |
| EQUIPE OBRA | | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | | | |
| NOME | FUNÇÃO | | NOME | FUNÇÃO | | |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | | |
| EDMILSON | SERVENTE | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: NÃO HOUE EXPEDIENTE NESSE DIA.


Registro Fotografico:

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel
BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:097665650
 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:16:04 -03'00'

Outros envolvidos


Samira Hersulano Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | | DADOS DA OBRA | |
|------------|---------------|--|--------|---|---------------|-------------------------|
| 23/12/2022 | SEGUNDA | | QUINTA | | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | | SEXTA | X | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | | SÁBADO | | Dias Corridos | |

| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | Das 07h às 17.00h | | | | |
| CHUVOSO | | | | | |

| EQUIPE PRESENTE | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------------|------------------|--|
| EQUIPE OBRA | | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | | |
| NOME | FUNÇÃO | | NOME | FUNÇÃO | |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | |
| EDMILSON | SERVENTE | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: NÃO HOUBE EXPEDIENTE NESSE DIA.

Registro Fotografico:

| REGISTRO DE OCORRÊNCIA | | |
|------------------------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel
Outros envolvidos

BRUNO GONCALVES Assinado de forma digital
 DE por BRUNO GONCALVES DE
 CASTILHO:0976665565 CASTILHO:09766655650
 0 Dados: 2023.02.02 11:17:05
 -03'00'


 Samira Herculano Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Econômico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| 26/12/2022 | | SEGUNDA | X | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | | TERÇA | | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | | QUARTA | | SÁBADO | Dias Corridos | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO | | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
| BOM | | Das 07h às 17.00h | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | | | | | | |
| CHUVOSO | X | | | | | |
| EQUIPE PRESENTE | | | | | | |
| EQUIPE OBRA | | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | | | |
| NOME | FUNÇÃO | | NOME | FUNÇÃO | | |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | | |
| EDMILSON | SERVENTE | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ATIVIDADES

Relatório: DEU CONTINUIDADE NA RETIRADA DO FORRO DE PVC EXISTENTE NO PLENÁRIO.

OBS: DEVIDO Á FORTE CHUVA IMPEDINDO DE TRABALHAR NA PARTE EXTERNA, FOI FEITO SERVIÇO SOMENTE NA PARTE INTERNA.

Registro Fotografico:



REGISTRO DE OCORRÊNCIA

| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

BRUNO GONCALVES DE
CASTILHO:09766655650

Assinado de forma digital por
BRUNO GONCALVES DE
CASTILHO:09766655650
Dados: 2023.02.02 11:16:26 -03'00'

Samira Herculano Pereira
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2015125090
Sec. Desenvolvimento Estratégico


DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|--|
| 27/12/2022 | SEGUNDA | | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL | |
| | TERÇA | X | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 | |
| | QUARTA | | SÁBADO | Dias Corridos | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant | |
| BOM | Das 07h às 17.00h | | | BL EDIFICAÇÕES | | |
| POUCA CHUVA | | | | | | |
| CHUVOSO | | X | | | | |
| EQUIPE OBRA | | | EQUIPE PRESENTE | | | |
| NOME | FUNÇÃO | | | NOME | FUNÇÃO | |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | |
| EDMILSON | SERVENTE | | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: RETIROU AS FERRAGENS QUE SEGURAVA O FORRO NO PLENÁRIO
 OBS: DEVIDO À FORTE CHUVA IMPEDINDO DE TRABALHAR NA PARTE EXTERNA, FOI FEITO SERVIÇO SOMENTE NA PARTE INTERNA.

Registro Fotografico:

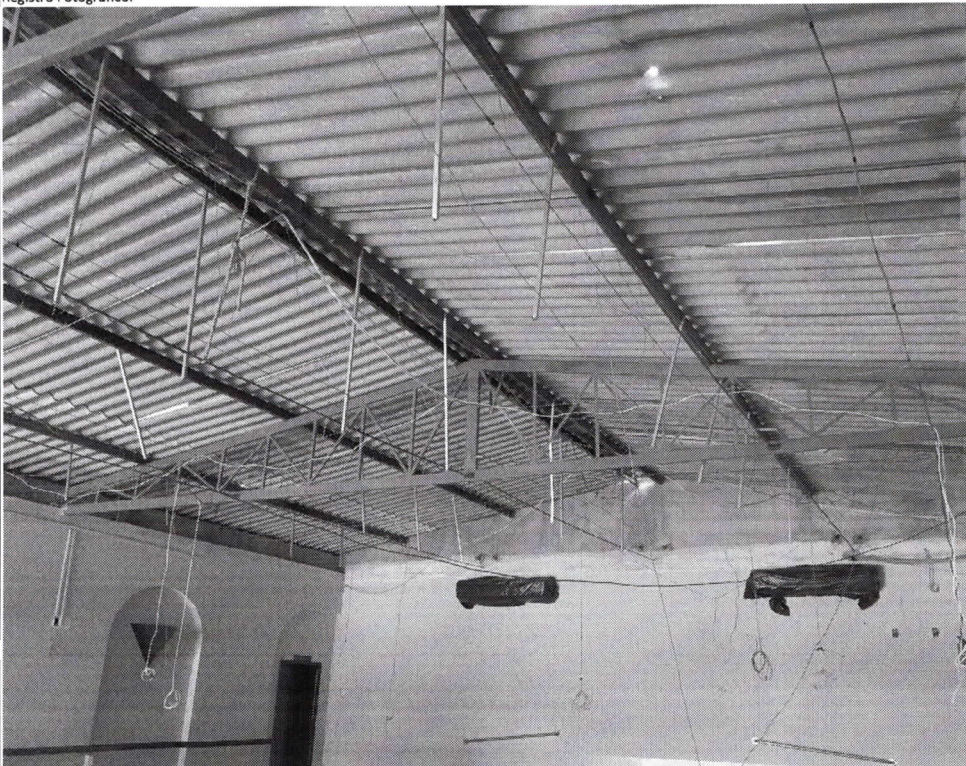

REGISTRO DE OCORRÊNCIA


| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650

Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:17:23 -03'00'


Samira Herculano Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | DADOS DA OBRA | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| 28/12/2022 | SEGUNDA | | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | X | SÁBADO | Dias Corridos | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
| BOM | Das 07h às 17.00h | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | | | | | |
| CHUVOSO | | X | | | |
| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | | | |
| NOME | FUNÇÃO | | | NOME | FUNÇÃO |
| FABRICIO | ELETRICISTA | | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL |
| | | | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ATIVIDADES

Relatório: ELETRICISTA DESLIGOU TODA FIAÇÃO QUE ESTAVA LIGADA NO PLENÁRIO, TANTO ACIMA DO FORRO QUANTO NAS MESAS DOS VEREADORES.
 OBS: DEVIDO Á FORTE CHUVA IMPEDINDO DE TRABALHAR NA PARTE EXTERNA, FOI FEITO SERVIÇO SOMENTE NA PARTE INTERNA.

Registro Fotografico:



REGISTRO DE OCORRÊNCIA

| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

BRUNO
 GONCALVES DE
 CASTILHO:09766
 655650

Assinado de forma digital
 por BRUNO GONCALVES DE
 CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:17:41
 -03'00'



 Samira Herculano Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | | DADOS DA OBRA | |
|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| 29/12/2022 | SEGUNDA | | QUINTA | X | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | | SEXTA | | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | | SÁBADO | | Dias Corridos | |
| | | | | | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
| BOM | Das 07h às 17.00h | | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | | | | | | |
| CHUVOSO | | X | | | | |
| EQUIPE OBRA | | | | EQUIPE PRESENTE | | |
| EQUIPE OBRA | | FUNÇÃO | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | | FUNÇÃO |
| NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO | | | |
| DONIZETE | ENCARREGADO | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | | | |
| EDMILSON | SERVENTE | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: INICIOU O CORTE NAS PAREDES DO PLENÁRIO PARA EMBUTIR A FIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAIXAS DE TOMADAS.
 OBS: DEVIDO Á FORTE CHUVA IMPEDINDO DE TRABALHAR NA PARTE EXTERNA, FOI FEITO SERVIÇO SOMENTE NA PARTE INTERNA.

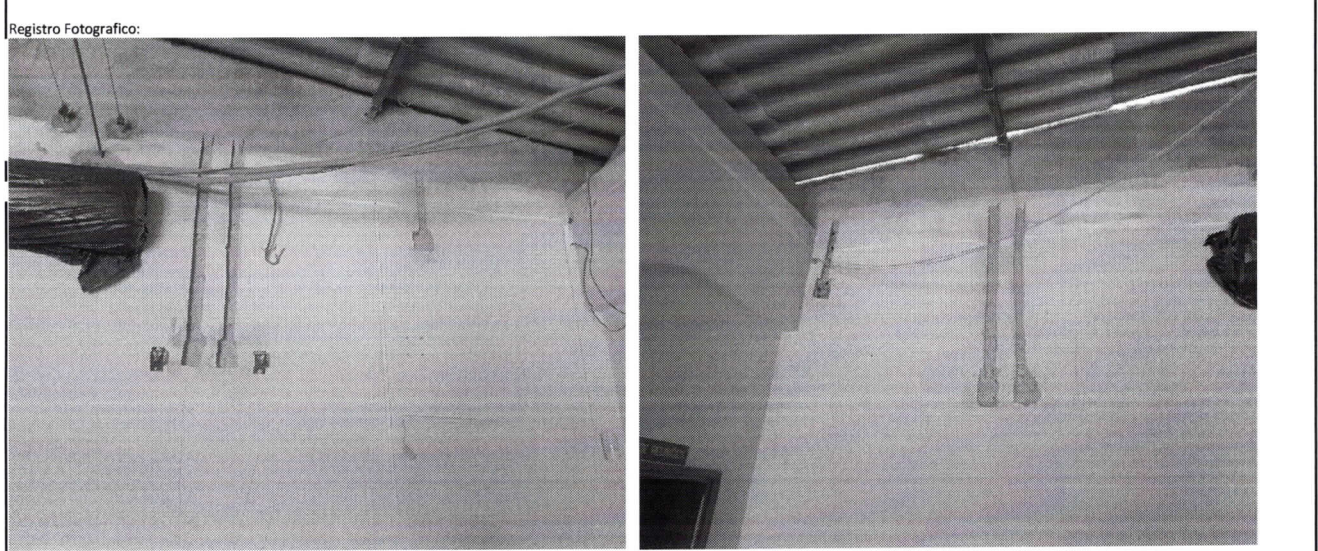

| REGISTRO DE OCORRÊNCIA | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Não houve | X | |
| Houve | | |
| _____ Engenheiro Responsavel | | _____ Outros envolvidos |

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:17:57 -03'00'


 Samira Herculano Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico


DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 30/12/2022 | SEGUNDA | | QUINTA | | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | | SEXTA | X | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | | SÁBADO | | Dias Corridos | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant | |
| BOM | Das 07h às 17.00h | | | BL EDIFICAÇÕES | | |
| POUCA CHUVA | | | | | | |
| CHUVOSO | | X | | | | |
| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | | |
| NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO | |
| DONIZETE | ENCARREGADO | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | |
| EDMILSON | SERVENTE | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: FINALIZOU OS CORTES NAS PAREDES NO PLENÁRIO.
 OBS: DEVIDO Á FORTE CHUVA IMPEDINDO DE TRABALHAR NA PARTE EXTERNA, FOI FEITO SERVIÇO SOMENTE NA PARTE INTERNA.

Registro Fotografico:

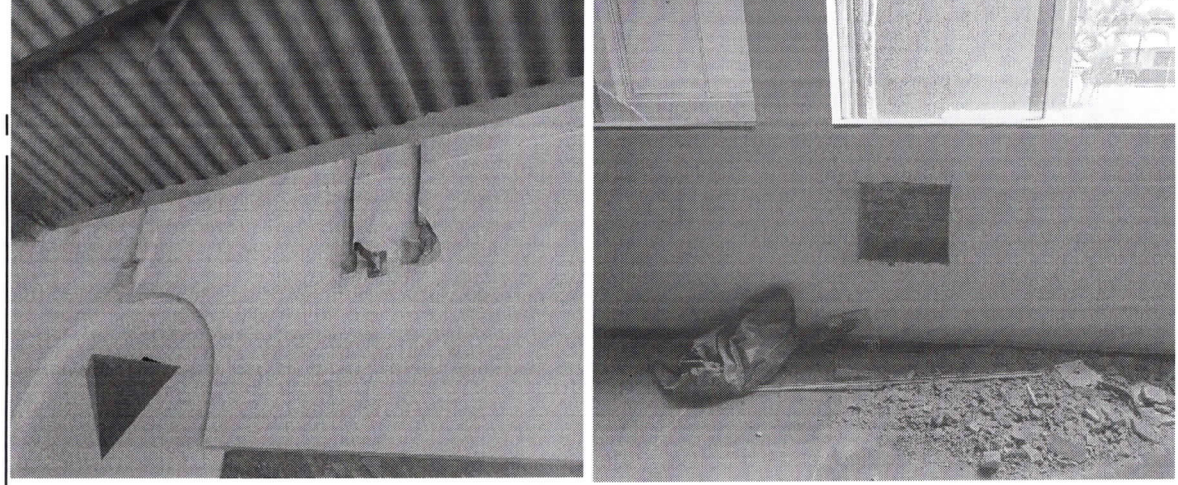

| REGISTRO DE OCORRÊNCIA | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Não houve | X | |
| Houve | | |
| _____ Engenheiro Responsavel | | _____ Outros envolvidos |

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:0976665565
 0

Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:18:14 -03'00'

Samira Herculano Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | |
|------------|---------------|---|--------|---------------|--------------------------|
| 01/02/2023 | SEGUNDA | | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | | SEXTA | Endereço | PCÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | X | SÁBADO | Dias Corridos | |

| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | X | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | Das 07h às 17.00h | | | | |
| CHUVOSO | | | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
|-------------|-------------|-----------------------|------------------|
| NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL |
| EDMILSON | SERVENTE | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| VALTER | SERVENTE | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: FEZ A ESTRUTURA PARA RECEBER O TELHADO DA MARQUISE DA FRENTE DA CÂMARA E FEZ O ENCANAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NOVA E ABASTECIMENTO QUE FOI COLOCADA ENCIMA DAS SALAS DOS VEREADORES PARA ABASTECE-LÁS.

Registro Fotografico:



| REGISTRO DE OCORRÊNCIA | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Não houve | X | |
| Houve | | |
| <p>_____</p> <p>Engenheiro Responsavel</p> | | <p>_____</p> <p>Outros envolvidos</p> |

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:097665650
 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:097665650
 Dados: 2023.02.02 11:28:44 -03'00'

Samira Herculano Pereira
 Engenheira Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | |
|------------|---------------|---|--------|---------------|-------------------------|
| 02/01/2023 | SEGUNDA | X | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | | SÁBADO | Dias Corridos | |

| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | Das 07h às 17.00h | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | | | | | |
| CHUVOSO | | X | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | | |
| EDMILSON | SERVENTE | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | | |
| LUCAS | PEDREIRO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: INICIOU A ALVENARIA DA PLATIBANDA

OBS: DEVIDO Á CHUVA CONTÍNUA DURANTE O DIA TODO, TEVE QUE POR VÁRIAS VEZES PARAR A EXECUÇÃO DA ALVENARIA, ASSIM AFETANDO DIRETAMENTE NO RENDIMENTO DA MESMA.

Registro Fotografico:



REGISTRO DE OCORRÊNCIA


| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650

Assinado de forma digital por
BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
Dados: 2023.02.02 11:19:29 -03'00'


Samira Herculano Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | |
|------------|---------------|---|--------|---------------|-------------------------|
| 03/01/2023 | SEGUNDA | | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | X | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | | SÁBADO | Dias Corridos | |

| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | | | | | |
| CHUVOSO | Das 07h às 17.00h | | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| NOME | FUNÇÃO | | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL |
| EDMILSON | SERVENTE | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| LUCAS | PEDREIRO | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: DEU CONTINUIDADE NA ALVENARIA DA PLATIBANDA

OBS: DEVIDO Á CHUVA CONTÍNUA DURANTE O DIA TODO, TEVE QUE POR VÁRIAS VEZES PARAR A EXECUÇÃO DA ALVENARIA, ASSIM AFETANDO DIRETAMENTE NO RENDIMENTO DA MESMA.

Registro Fotografico:



REGISTRO DE OCORRÊNCIA


| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655
650

Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
Dados: 2023.02.02 11:23:25 -03'00'


Samira Herculano Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | | |
|------------|---------------|---|--------|---------------|-------------------------|--|
| 04/01/2023 | SEGUNDA | | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL | |
| | TERÇA | | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 | |
| | QUARTA | X | SÁBADO | Dias Corridos | | |

| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | Das 07h às 17.00h | | | | |
| CHUVOSO | | | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| NOME | FUNÇÃO | | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL |
| EDMILSON | SERVENTE | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| LUCAS | PEDREIRO | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: DEU CONTINUIDADE NA ALVENARIA DA PLATIBANDA
 OBS: DEVIDO Á CHUVA CONTÍNUA DURANTE O DIA TODO, TEVE QUE POR VÁRIAS VEZES PARAR A EXECUÇÃO DA ALVENARIA, ASSIM AFETANDO DIRETAMENTE NO RENDIMENTO DA MESMA.

Registro Fotografico:



REGISTRO DE OCORRÊNCIA

| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:23:09 -03'00'

Samira Hersulano Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| 05/01/2023 | SEGUNDA | | QUINTA | X | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | | SEXTA | | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | | SÁBADO | | Dias Corridos | |
| | | | | | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
| BOM | | | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | Das 07h às 17.00h | | | | | |
| CHUVOSO | X | | | | | |
| EQUIPE PRESENTE | | | | | | |
| EQUIPE OBRA | | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | | | |
| NOME | FUNÇÃO | | | NOME | FUNÇÃO | |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | |
| EDMILSON | SERVENTE | | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | |
| LUCAS | PEDREIRO | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: DEU CONTINUIDADE NA ALVENARIA DA PLATIBANDA
 OBS: DEVIDO Á CHUVA CONTÍNUA DURANTE O DIA TODO, TEVE QUE POR VÁRIAS VEZES PARAR A EXECUÇÃO DA ALVENARIA, ASSIM AFETANDO DIRETAMENTE NO RENDIMENTO DA MESMA.



| REGISTRO DE OCORRÊNCIA | | |
|------------------------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

 Engenheiro Responsavel

 Outros envolvidos

Assinado de forma digital por
 BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:0976665565
 0
 Dados: 2023.02.02 11:22:52 -03'00'

Samira Herculano Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | | |
|------------|---------------|--|--------|---------------|------------------|-------------------------|
| 06/01/2023 | SEGUNDA | | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL | |
| | TERÇA | | SEXTA | X | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | | SÁBADO | | Dias Corridos | |

| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | Das 07h às 17.00h | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | | | | | |
| CHUVOSO | | X | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|
| NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | | |
| EDMILSON | SERVENTE | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | | |
| LUCAS | PEDREIRO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: DEU CONTINUIDADE NA ALVENARIA DA PLATIBANDA
OBS: DEVIDO Á CHUVA CONTÍNUA DURANTE O DIA TODO, TEVE QUE POR VÁRIAS VEZES PARAR A EXECUÇÃO DA ALVENARIA, ASSIM AFETANDO DIRETAMENTE NO RENDIMENTO DA MESMA.

Registro Fotografico:



REGISTRO DE OCORRÊNCIA

| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

BRUNO GONCALVES
DE
CASTILHO:09766655
650

Assinado de forma digital
por BRUNO GONCALVES DE
CASTILHO:09766655650
Dados: 2023.02.02 11:22:36
-03'00'

Samira Heresano Pereira
Engenheira Civil
CREA-RJ 2015125090
Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | | |
|------------|---------------|---|--------|---------------|-------------------------|--|
| 09/01/2023 | SEGUNDA | X | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL | |
| | TERÇA | | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 | |
| | QUARTA | | SÁBADO | Dias Corridos | | |

| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | Das 07h às 17.00h | | | | |
| CHUVOSO | X | | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| NOME | FUNÇÃO | | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL |
| EDMILSON | SERVENTE | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| CLÉSIO | PEDREIRO | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: DEU CONTINUIDADE NA ALVENARIA DA PLATIBANDA
 OBS: DEVIDO Á CHUVA CONTÍNUA DURANTE O DIA TODO, TEVE QUE POR VÁRIAS VEZES PARAR A EXECUÇÃO DA ALVENARIA, ASSIM AFETANDO DIRETAMENTE NO RENDIMENTO DA MESMA.

Registro Fotografico:



REGISTRO DE OCORRÊNCIA

| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

**BRUNO
 GONCALVES DE
 CASTILHO:097666
 55650**

Outros envolvidos

Assinado de forma digital
 por BRUNO GONCALVES DE
 CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:22:19
 -03'00'

Samira Herculino Pereira
 Engenheira Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | | |
|------------|---------------|---|--------|---------------|-------------------------|--|
| 10/01/2023 | SEGUNDA | | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL | |
| | TERÇA | X | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 | |
| | QUARTA | | SÁBADO | Dias Corridos | | |
| | | | | | | |


| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | Das 07h às 17.00h | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | | | | | |
| CHUVOSO | | X | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL |
| EDMILSON | SERVENTE | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| CLÉSIO | PEDREIRO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: COMEÇOU A CHUMBAR AS CAIXINHAS DAS TOMADAS DENTRO DO PLENÁRIO.
 OBS: CHUVA MUITO FORTE DURANTE O DIA TODO.

Registro Fotografico:

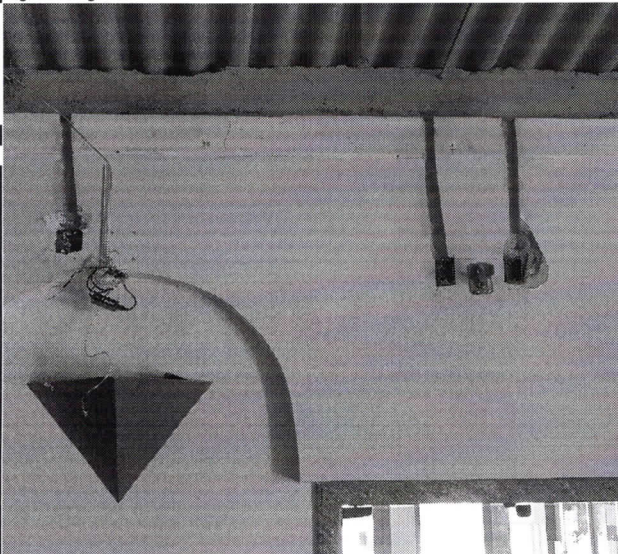

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

**BRUNO
GONCALVES DE
CASTILHO:0976665
5650**

Assinado de forma digital
 por BRUNO GONCALVES DE
 CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:22:01
 -03'00'

Samira Hercula Pereira
 Engenheira Civil
 CREA-RJ 2016125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | | |
|------------|---------------|---|--------|---------------|-------------------------|--|
| 11/01/2023 | SEGUNDA | | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL | |
| | TERÇA | | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 | |
| | QUARTA | X | SÁBADO | Dias Corridos | | |


| CONDIÇÕES DO TEMPO | | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | | Das 07h às 17.00h | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | X | | | | | |
| CHUVOSO | | | | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| NOME | FUNÇÃO | | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL |
| EDMILSON | SERVENTE | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| CLÉSIO | PEDREIRO | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: DEU CONTINUIDADE NO CHUMBAMENTO DAS CAIXINHAS DAS TOMADAS NO PLENÁRIO E DESENFORMOU OS PILARES DA PLATIBANDA.
 OBS: A ALVENARIA DA PLATIBANDA E AS TELHAS ESTAVAM MUITO MOLHADA IMPEDINDO A EXECUÇÃO DO CHAPISCO E CONTINUIDADE DA ALVENARIA DA PLATIBANDA NO PERÍODO DA MANHÃ.

Registro Fotografico:

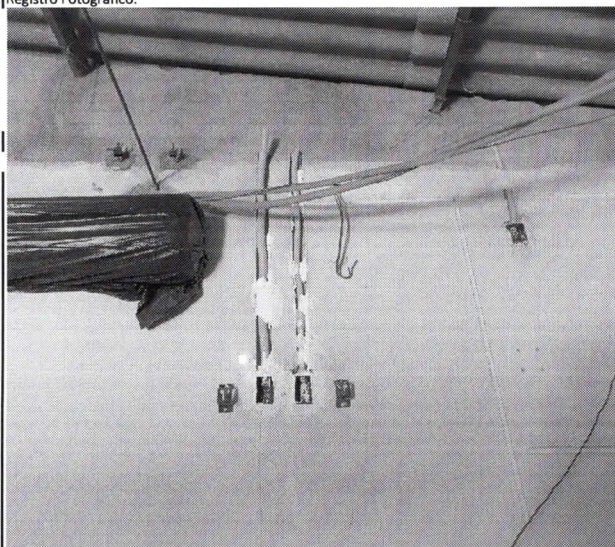

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

**BRUNO
GONCALVES DE
CASTILHO:097666
55650**

Assinado de forma digital
 por BRUNO GONCALVES
 DE CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:21:44
 -03'00'

Samira Heronino Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | DADOS DA OBRA |
|------------|---------------|-------------------------|
| 12/01/2023 | SEGUNDA | |
| | TERÇA | |
| | QUARTA | |
| | QUINTA | X |
| | | Obra |
| | | CÂMARA MUNICIPAL |
| | | Endereço |
| | | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | | Dias Corridos |

| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | X | Das 07h às 17.00h | | | |
| CHUVOSO | | | | | |

| EQUIPE PRESENTE | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| EQUIPE OBRA | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
| NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL |
| EDMILSON | SERVENTE | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| CLÉSIO | PEDREIRO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: COMEÇOU A CHAPISCAR A ALVENRIA DA PLATIBANDA.
 OBS: DEVIDO Á CHUVA CONTÍNUA DURANTE O DIA TODO, TEVE QUE POR VÁRIAS VEZES PARAR A EXECUÇÃO DO CHAPISCO, ASSIM AFETANDO DIRETAMENTE NO RENDIMENTO DO MESMO.

Registro Fotografico:



REGISTRO DE OCORRÊNCIA

| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:0976665565
 0

Assinado de forma digital por
 BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:21:28 -03'00'


 Samira Herculano Pereira
 Engenheira Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | DADOS DA OBRA |
|------------|---------------|---|
| 13/01/2023 | SEGUNDA | Obra |
| | TERÇA | CÂMARA MUNICIPAL PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | Endereço |
| | QUINTA | Dias Corridos |


| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | Das 07h às 17.00h | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | | | | | |
| CHUVOSO | | X | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| NOME | FUNÇÃO | | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL |
| EDMILSON | SERVENTE | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| CLÉSIO | PEDREIRO | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: DEU CONTINUIDADE NO CHAPISCO DA PLATIBANDA
OBS: CHOVEU NA PARTE DA TARDE TODA.

Registro Fotografico:

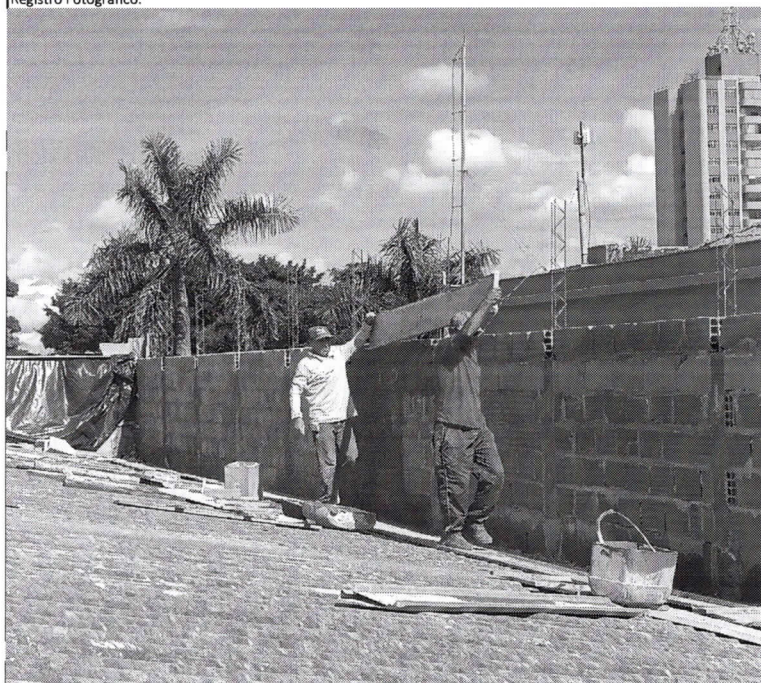

REGISTRO DE OCORRÊNCIA


| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:0976665565
0

Assinado de forma digital por
BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
Dados: 2023.02.02 11:21:12 -03'00'


Samira Herculano Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | |
|------------|---------------|---|--------|---------------|-------------------------|
| 17/01/2023 | SEGUNDA | | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | X | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | | SÁBADO | Dias Corridos | |

| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | Das 07h às 17.00h | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | | | | | |
| CHUVOSO | | X | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------|
| NOME | FUNÇÃO | | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | |
| EDMILSON | SERVENTE | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | |
| CLÉSIO | PEDREIRO | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: EMBOÇO INTERNO DA PLATIBANDA NO TELHADO
OBS: CHUVA AO LOGO DO DIA, ATRAPALHANDO AS ATIVIDADES

Registro Fotografico:

[Empty area for photographic registration]

| REGISTRO DE OCORRÊNCIA | | |
|------------------------|---|-------------------|
| Não houve | X | |
| Houve | | |
| Engenheiro Responsavel | | Outros envolvidos |

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655 650
Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
Dados: 2023.02.02 11:27:38 -03'00'

Camila Herculano Pereira
Engenheira Civil
CREA-RJ 20115125090
Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | | |
|------------|---------------|---|--------|---------------|-------------------------|--|
| 16/01/2023 | SEGUNDA | X | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL | |
| | TERÇA | | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 | |
| | QUARTA | | SÁBADO | Dias Corridos | | |

| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | Das 07h às 17.00h | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | | | | | |
| CHUVOSO | | X | | | |

| EQUIPE PRESENTE | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| EQUIPE OBRA | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
| NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL |
| EDMILSON | SERVENTE | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| CLÉSIO | PEDREIRO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: CHAPISCO E REBOCO PLATIBANDA
 OBS: CHOVEU NA PARTE DA TARDE TODA.

Registro Fotografico:




| REGISTRO DE OCORRÊNCIA | | |
|------------------------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

BRUNO GONCALVES DE
 CASTILHO:0976665565
 0

Assinado de forma digital por
 BRUNO GONCALVES DE
 CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:20:55
 -03'00'


 Samira Herculano Pereira
 Engenheira Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | DADOS DA OBRA |
|------------|---------------|---------------|
| 18/01/2023 | SEGUNDA | Obra |
| | TERÇA | Endereço |
| | QUARTA | Dias Corridos |

| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | Das 07h às 17.00h | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | | | | | |
| CHUVOSO | | X | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL |
| EDMILSON | SERVENTE | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| CLÉSIO | PEDREIRO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: ENTREGA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DO TELHADO
 OBS: CHUVA FORTE DURANTE TODO O DIA

Registro Fotografico:


REGISTRO DE OCORRÊNCIA

| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:27:22 -03'00'


 Samira Herculano Pereira
 Engenheira Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Set. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | | |
|------------|---------------|--|--------|---------------|---------------|-------------------------|
| 19/01/2023 | SEGUNDA | | QUINTA | X | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | | SEXTA | | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | | SÁBADO | | Dias Corridos | |
| | | | | | | |

| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | X | | | | |
| CHUVOSO | | | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| NOME | FUNÇÃO | | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL |
| EDMILSON | SERVENTE | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: CHAPISCO E EMBOÇO DA PLATIBANDA DO TELHADO
 OBS: ENTREGA DAS TELHAS TIPO SANDUÍCHE. DESCARREGAMENTO UTILIZANDO CAMINHÃO MUNK

Registro Fotografico:



| REGISTRO DE OCORRÊNCIA | | |
|------------------------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:27:07 -03'00'

Samira Herculano Pereira
 Engenheira Civil
 CREA-RJ 2016125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | | |
|---------------------------------|-------------------|--------|--------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 23/01/2023 | SEGUNDA | X | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL | |
| | TERÇA | | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 | |
| | QUARTA | | SÁBADO | Dias Corridos | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | | | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa |
| BOM | | | | | | BL EDIFICAÇÕES |
| POUCA CHUVA | Das 07h às 17.00h | | | | | |
| CHUVOSO | X | | | | | |
| EQUIPE OBRA | | | | EQUIPE PRESENTE | | |
| EQUIPE OBRA | | FUNÇÃO | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | | FUNÇÃO |
| NOME | | | | | NOME | |
| DONIZETE | | | | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL |
| EDMILSON | | | | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| CLÉSIO | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ATIVIDADES | | | | | | |
| Relatorio: SEM ATIVIDADES | | | | | | |
| OBS: CHUVA INTENSA O DIA TODO | | | | | | |
| Registro Fotografico: | | | | | | |
| | | | | | | |
| REGISTRO DE OCORRÊNCIA | | | | | | |
| Não houve | X | | | | | |
| Houve | | | | | | |
| _____ Engenheiro Responsavel | | | | _____ Outros envolvidos | | |

BRUNO GONCALVES DE
 CASTILHO:0976665565
 0

Assinado de forma digital por
 BRUNO GONCALVES DE
 CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:26:32
 -03'00'


 Bruno Goncalves de Castilho
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 2015125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | |
|------------|---------------|---|--------|---------------|-------------------------|
| 24/01/2023 | SEGUNDA | | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | X | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | | SÁBADO | Dias Corridos | |

| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | Das 07h às 17.00h | | | | |
| CHUVOSO | | | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
|-------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------|--|
| NOME | FUNÇÃO | | NOME | FUNÇÃO | |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | |
| EDMILSON | SERVENTE | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: SEM ATIVIDADES
OBS: CHUVA INTENSA O DIA TODO

Registro Fotografico:

| REGISTRO DE OCORRÊNCIA | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Não houve | X | |
| Houve | | |
| _____ Engenheiro Responsavel | | _____ Outros envolvidos |

BRUNO GONCALVES
DE
CASTILHO:0976665565
0

Assinado de forma digital
por BRUNO GONCALVES DE
CASTILHO:09766655650
Dados: 2023.02.02 11:26:15
-03'00'

Samira Herculano Pereira
Engenheira Civil
CREA-RJ 2015125090
Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | | DADOS DA OBRA | |
|------------|---------------|---|--------|--|---------------|-------------------------|
| 25/01/2023 | SEGUNDA | | QUINTA | | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | | SEXTA | | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | X | SÁBADO | | Dias Corridos | |
| | | | | | | |


| CONDIÇÕES DO TEMPO | | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | X | Das 07h às 17.00h | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | | | | | | |
| CHUVOSO | | | | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|
| NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| EDMILSON | SERVENTE | | | | |
| ROGÉRIO | SERRALHEIRO | | | | |
| GUILHERME | SERRALHEIRO | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: DESMONTAGEM DO TELHADO ANTIGO / DEMOLIÇÃO DE PAREDE DAS ANTIGAS PLATIBANDAS
 OBS: CHUVA FORTE DURANTE TODO O DIA

Registro Fotografico:

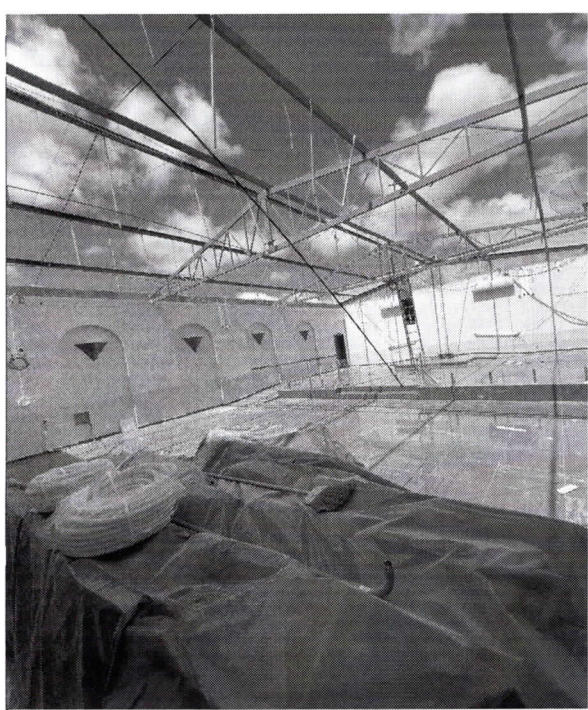

| REGISTRO DE OCORRÊNCIA | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Não houve | X | |
| Houve | | |
| _____ Engenheiro Responsavel | | _____ Outros envolvidos |

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:097666556
 50
 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:26:00 -03'00'

Samira Herculano Pereira
 Engenheira Civil
 CREA-RJ 2018/125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | |
|------------|--|---------------|--|--------|---|---------------|
| 26/01/2023 | | SEGUNDA | | QUINTA | X | Obra |
| | | TERÇA | | SEXTA | | Endereço |
| | | QUARTA | | SÁBADO | | Dias Corridos |
| | | | | | CÂMARA MUNICIPAL PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 | |


| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------|
| BOM | X | | MUNK | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | Das 07h às 17.00h | | | | |
| CHUVOSO | | | | | |

| EQUIPE OBRA | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | |
|-------------|-------------|-----------------------|------------------|
| NOME | FUNÇÃO | NOME | FUNÇÃO |
| DONIZETE | ENCARREGADO | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL |
| EDMILSON | SERVENTE | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL |
| ROGÉRIO | SERRALHEIRO | | |
| GUILHERME | SERRALHEIRO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ATIVIDADES

SERVIÇOS REALIZADOS: DEMOLIÇÕES NO TELHADO ANTIGO; LIMPEZA DE ENTULHOS NOVOS E ANTIGOS (JÁ ESTAVAM PRESENTES NO TELHADO); IÇAMENTO DAS PEÇAS DA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO NOVO; MONTAGEM DAS TESOURAS (EMENDA DAS PARTES)

Registro Fotografico:

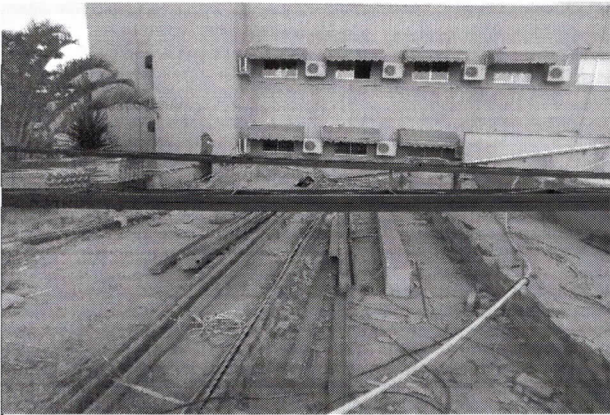

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Não houve | X | |
| Houve | | |
| _____ Engenheiro Responsavel | | _____ Outros envolvidos |

**BRUNO
GONCALVES DE
CASTILHO:09766
655650**

Assinado de forma digital
por BRUNO GONCALVES DE
CASTILHO:0976655650
Dados: 2023.02.02 11:25:44
-03'00'

Vanessa Herculano Pereira
 Engenheira Civil
 CREA-RJ 2018125090
 Sec. Desenvolvimento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 27/01/2023 | SEGUNDA | | QUINTA | | Obra | CÂMARA MUNICIPAL |
| | TERÇA | | SEXTA | X | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| | QUARTA | | SÁBADO | | Dias Corridos | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant | |
| BOM | | | MUNK | BL EDIFICAÇÕES | | |
| POUCA CHUVA | Das 07h às 17.00h | | | | | |
| CHUVOSO | X | | | | | |
| EQUIPE PRESENTE | | | | | | |
| EQUIPE OBRA | | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | | | |
| NOME | FUNÇÃO | | | NOME | FUNÇÃO | |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | |
| EDMILSON | SERVENTE | | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | |
| ROGÉRIO | SERRALHEIRO | | | | | |
| GUILHERME | SERRALHEIRO | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: SEM ATIVIDADES

OBS: CHUVA INTENSA O DIA TODO
Registro Fotografico:


REGISTRO DE OCORRÊNCIA

| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

Outros envolvidos

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650 Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
Dados: 2023.02.02 11:25:25 -03'00'


Brno Herculano Pereira
 Engenheiro Civil
 REA-RJ 2015125090
 Engenharia e Planejamento Estratégico


DIÁRIO DE OBRA

| DIÁRIO DE OBRA | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------|
| DATA | | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | | |
| 30/01/2023 | | SEGUNDA | X | QUINTA | Obra | CÂMARA MUNICIPAL | |
| | | TERÇA | | SEXTA | Endereço | PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 | |
| | | QUARTA | | SÁBADO | Dias Corridos | | |
| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | | | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
| BOM | X | | | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | | Das 07h às 17.00h | | | | | |
| CHUVOSO | | | | | | | |
| EQUIPE PRESENTE | | | | | | | |
| EQUIPE OBRA | | | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | | | |
| NOME | FUNÇÃO | | | NOME | FUNÇÃO | | |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | | |
| EDMILSON | SERVENTE | | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | | |
| VALTER | SERVENTE | | | | | | |
| ROGÉRIO | SERRALHEIRO | | | | | | |
| GUILHERME | SERRALHEIRO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: SERRALHEIRO TERMINOU A COLOCAÇÃO DA METADE DO TELHADO.

Registro Fotografico:

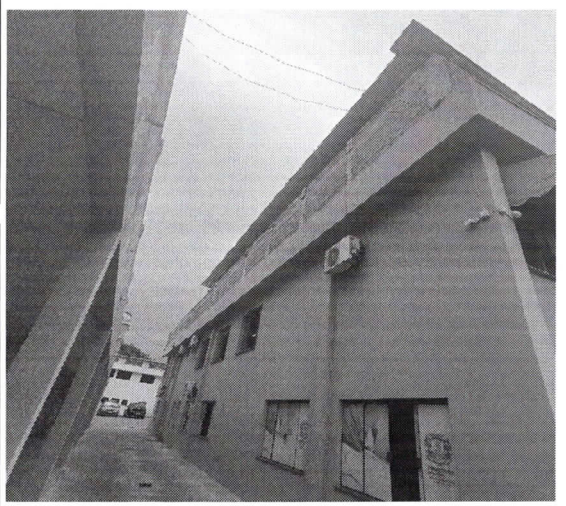


| REGISTRO DE OCORRÊNCIA | | |
|------------------------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

 Engenheiro Responsavel

 Outros envolvidos

BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Assinado de forma digital por
 BRUNO GONCALVES DE CASTILHO:09766655650
 Dados: 2023.02.02 11:25:00 -03'00'


Bruno Pereira
 Engenheiro Civil
 RJ 2015125090
 Involvemento Estratégico

DIÁRIO DE OBRA

| DATA | | DIA DA SEMANA | | | DADOS DA OBRA | |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------|----------------------------|------------------|---|
| 31/01/2023 | | SEGUNDA | TERÇA | QUINTA | SEXTA | Obra |
| | | X | | X | | CÂMARA MUNICIPAL PÇA FAUSTO MONTEIRO, 85 |
| CONDIÇÕES DO TEMPO | PERÍODO DE CHUVA | ITENS PREJUDICADOS | | Equipamentos e Ferramentas | Empresa | Quant |
| BOM | X | | | | BL EDIFICAÇÕES | |
| POUCA CHUVA | Das 07h às 17.00h | | | | | |
| CHUVOSO | | | | | | |
| EQUIPE OBRA | | EQUIPE PRESENTE | | EQUIPE BL EDIFICAÇÕES | | |
| NOME | FUNÇÃO | | | | | |
| DONIZETE | ENCARREGADO | | | BRUNO CASTILHO | ENGENHEIRO CIVIL | |
| EDMILSON | SERVENTE | | | EVERTON | ENGENHEIRO CIVIL | |
| VALTER | SERVENTE | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ATIVIDADES

Relatorio: FEZ A LIMPEZA DO RESTANTE DE ENTULHO DO TELHADO ANTIGO ONDE FOI FEITO JÁ O NOVO TELHADO E FEZ A ALVENARIA QUE IRÁ RECEBER A CALHA DO TELHADO DA MARQUISE DA FRENTE DA CÂMARA.

Registro Fotografico:



REGISTRO DE OCORRÊNCIA

| | | |
|-----------|---|--|
| Não houve | X | |
| Houve | | |

Engenheiro Responsavel

**BRUNO
GONCALVES DE
CASTILHO:097666
55650**

Assinado de forma digital
por BRUNO GONCALVES
DE
CASTILHO:09766655650
Dados: 2023.02.02
11:27:56 -03'00'

Outros envolvidos

Samira Herculano Pereira
Engenheira Civil
CREA-RJ 2015125090
Sec. Desenvolvimento Estratégico
